

2025 年上半年 信息系统项目管理师 上午模拟试题 二

章：信息化发展 节：信息与信息化 知识点：信息化

● 信息化内涵中，(1) 包括劳动者素质、国家现代化水平和人民生活质量的不断提高，精神文明和物质文明建设不断进步等。

- (1) A. 信息网络体系
B. 信息产业基地
C. 社会运行环境
D. 效用积累过程

【参考答案】D

【解析】

信息化内涵主要包括：

- 信息网络体系：包括信息资源、各种信息系统、公用通信网络平台等。
- 信息产业基地：包括信息科学技术研究与开发、信息装备制造、信息咨询服务等。
- 社会运行环境：包括现代工农业、管理体制、政策法律、规章制度、文化教育、道德观念等生产关系与上层建筑。
- 效用积累过程：包括劳动者素质、国家现代化水平和人民生活质量的不断提高，精神文明和物质文明建设不断进步等。

章：信息化发展 节：现代化基础设施 知识点：工业互联网

● 工业互联网融合应用初步形成了六大类典型应用模式，其中不包括：(2)。

- (2) A. 平台化设计
B. 大众化定制
C. 智能化制造
D. 网络化协同

【参考答案】B

【解析】

工业互联网融合应用推动了一批新模式、新业态孕育兴起，提质、增效、降本、绿色、安全发展成效显著，初步形成了六大类典型应用模式。

(1) 平台化设计。平台化设计是依托工业互联网平台，汇聚人员、算法、模型、任务等设计资源，实现高水平高效率的轻量化设计、并行设计、敏捷设计、交互设计和基于模型的设计，变革传统设计方式，提升研发质量和效率。

(2) 智能化制造。智能化制造是互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术在制造业领域加速创新应用，实现材料、设备、产品等生产要素与用户之间的在线连接和实时交互，逐步实现机器代替人工生产，智能化代表制造业未来发展的趋势。

(3) 网络化协同。网络化协同是通过跨部门、跨层级、跨企业的数据互通和业务互联，推动供应链上的企业和合作伙伴共享客户、订单、设计、生产、经营等各类信息资源，实现网络化的协同设计、协同生产、协同服务，进而促进资源共享、能力交易以及业务优化配置等。

(4) 个性化定制。个性化定制是面向消费者个性化需求，通过客户需求准确获取和分析、敏捷产品开发设计、柔性智能生产、精准交付服务等，实现用户在产品全生命周期中的深度参与，是以低成本、高质量和高效率的大批量生产实现产品个性化设计、生产、销售及服务的—种制造服务模式。

(5) 服务化延伸。服务化延伸是制造与服务融合发展的新型产业形态，指的是企业从原有

制造业务向价值链两端高附加值环节延伸，从以加工组装为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变，具体包括设备健康管理、产品远程运维、设备融资租赁、分享制造、互联网金融等。

(6) 数字化管理。数字化管理是企业通过打通核心数据链，贯通制造全场景、全过程，基于数据的广泛汇聚、集成优化和价值挖掘，优化、创新乃至重塑企业战略决策、产品研发、生产制造、经营管理、市场服务等业务活动，构建数据驱动的高效运营管理新模式。

章：信息化发展 节：数字中国 知识点：数字经济

● 下面有关数字经济的描述，不正确的是：(3)。

- (3) A. 数字经济是继农业经济、工业经济之后的更高级经济形态
B. 从产业构成来看，数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分
C. 从整体构成上看，数字经济包括数字产业化、产业数字化和数据价值化三个部分
D. 数字经济的技术经济范式的结构主要包括驱动力、新结构、价值创造和经济增长

【参考答案】C

【解析】

数字经济是继农业经济、工业经济之后的更高级经济形态。从本质上看，数字经济是一种新的技术经济范式，它建立在信息与通信技术的重大突破的基础上，以数字技术与实体经济融合驱动的产业梯次转型和经济创新发展的主引擎，在基础设施、生产要素、产业结构和治理结构上表现出与农业经济、工业经济显著不同的新特点。

数字经济的技术经济范式的结构主要包括驱动力、新结构、价值创造和经济增长。

从产业构成来看，数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分。《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》给出了数字经济具体分类，分别是：数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业和数字化效率提升业，其中，前4类为数字产业化部分，第5类为产业数字化部分。从整体构成上看，数字经济包括数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化四个部分。

章：信息技术发展 节：信息技术及其发展 知识点：计算机网络

● 下面有关软件定义网络的描述，不正确的是：(4)。

- (4) A. 软件定义网络(SDN)是一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式
B. 软件定义网络(SDN)将网络设备的控制面与数据面分离
C. 软件定义网络(SDN)的整体架构由上到下分为数据平面、控制平面和应用平面
D. 软件定义网络(SDN)使网络变得更加智能

【参考答案】C

【解析】

软件定义网络(Software Defined Network, SDN)是一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式，它可通过软件编程的形式定义和控制网络，其通过将网络设备的控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络变得更加智能，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。

SDN的整体架构由下到上(由南到北)分为数据平面、控制平面和应用平面，具体如下图所示。

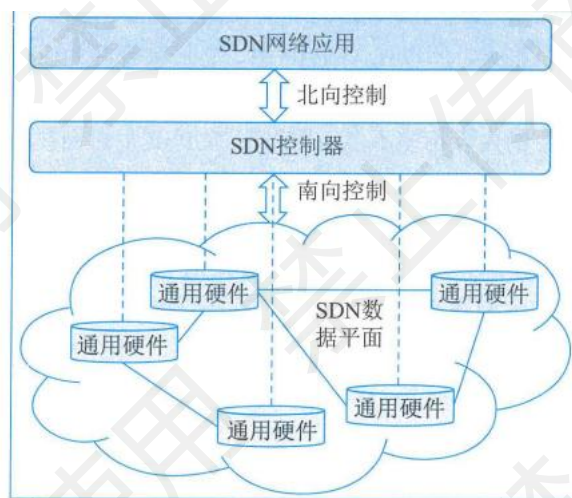


图 SDN 体系架构图

章：信息技术发展 节：新一代信息技术及应用 知识点： 大数据

● 大数据区别于传统数据挖掘的最显著特征是 (5)。

- (5) A. 数据海量
B. 数据类型多样
C. 数据价值密度低
D. 数据处理速度快

【参考答案】D

【解析】

一般来说，大数据主要特征包括：

●数据海量：大数据的数据体量巨大，从 TB 级别跃升到 PB 级别 (1PB=1024TB)、EB 级别 (1EB=1024PB)，甚至达到 ZB 级别 (1ZB=1024EB)。

●数据类型多样：大数据的数据类型繁多，一般分为结构化数据和非结构化数据。相对于以往便于存储的以文本为主的结构化数据，非结构化数据越来越多，包括网络日志、音频、视频、图片、地理位置信息等，这些多类型的数据对数据的处理能力提出了更高要求。

●数据价值密度低：数据价值密度的高低与数据总量的大小成反比。以视频为例，一部 1 小时的视频，在连续不间断的监控中，有用数据可能仅有一二秒。如何通过强大的机器算法更迅速地完成数据的价值“提纯”，成为目前大数据背景下亟待解决的难题。

●数据处理速度快：为了从海量的数据中快速挖掘数据价值，一般要求要对不同类型的数据进行快速的处理，这是大数据区别于传统数据挖掘的最显著特征。

章：信息系统治理 节：IT 治理 知识点： IT 治理体系

● IT 治理体系框架不包括 (6)。

- (6) A. IT 战略目标
B. IT 治理人员
C. IT 治理机制
D. IT 绩效目标

【参考答案】B

【解析】

IT 治理体系框架具体包括：IT 战略目标、IT 治理组织、IT 治理机制、IT 治理域、IT 治理标准和 IT 绩效目标等部分，形成一整套 IT 治理运行闭环，如下图所示。



图 IT 治理体系框架

章：信息系统治理 节：IT 审计 知识点：IT 审计基础

● 组织的 IT 目标主要包括：(7)。

- ①组织的 IT 战略应与业务战略保持一致
- ②保护信息资产的安全及数据的完整、可靠、有效
- ③提高信息系统的安全性、可靠性及有效性
- ④合理保证信息系统及其运用符合有关法律、法规及标准等的要求。

- (7) A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ①②③④

【参考答案】D

【解析】

组织的 IT 目标主要包括：①组织的 IT 战略应与业务战略保持一致；②保护信息资产的安全及数据的完整、可靠、有效；③提高信息系统的安全性、可靠性及有效性；④合理保证信息系统及其运用符合有关法律、法规及标准等的要求。

章：信息系统治理 节：IT 审计 知识点：审计方法与技术

● 审计底稿的作用不包括：(8)。

- (8) A. 是形成审计结论、发表审计意见的直接依据
B. 是评价信息系统的主要依据
C. 是审计质量控制与监督的基础
D. 对未来审计业务具有参考备查作用

【参考答案】B

【解析】

审计底稿的作用表现在：

- 是形成审计结论、发表审计意见的直接依据；
- 是评价考核审计人员的主要依据；
- 是审计质量控制与监督的基础；
- 对未来审计业务具有参考备查作用。

章：信息系统管理 节：管理方法 知识点：管理基础

● 信息系统包括四个要素不包括：(9)。

- (9) A. 人员
B. 技术
C. 硬件
D. 数据

【参考答案】C

【解析】

信息系统包括四个要素：人员、技术、流程和数据。

章：信息系统管理 节：管理要点 知识点：运维管理

● 从分类上来说，运维技术聚焦在(10)两大领域。

- (10) A. 发现问题的技术和解决问题的技术
B. 发现问题的技术和分析问题的技术
C. 预防问题的技术和发现问题的技术
D. 预防问题的技术和解决问题的技术

【参考答案】A

【解析】

从分类上来说，运维技术聚焦在发现问题的技术和解决问题的技术两大领域。

章：信息系统工程 节：软件工程 知识点：需求分析

● 使用结构化分析方法进行需求分析时，一般使用(11)表示功能模型。

- (11) A. 数据模型
B. 数据流图
C. 状态转换图
D. 活动图

【参考答案】B

【解析】

使用结构化分析(Structured Analysis, SA)方法进行需求分析，其建立的模型的核心是数据字典。围绕这个核心，有三个层次的模型，分别是数据模型、功能模型和行为模型(也称为状态模型)。在实际工作中，一般使用实体关系图(E-R图)表示数据模型，用数据流图(Data Flow Diagram, DFD)表示功能模型，用状态转换图(State Transform Diagram, STD)表示行为模型。

章：信息系统工程 节：软件工程 知识点：软件实现

● (12)将程序看作是一个透明的白盒，测试人员完全清楚程序的结构和处理算法，按照程序内部逻辑结构设计测试用例，检测程序中的主要执行通路是否都能按预定要求正确工作。

- (12) A. 白盒测试
B. 黑盒测试
C. 静态测试
D. 动态测试

【参考答案】A

【解析】

软件测试方法可分为静态测试和动态测试。①静态测试是指被测试程序不在机器上运行，而采用人工检测和计算机辅助静态分析的手段对程序进行检测。静态测试包括对文档的静态测试和对代码的静态测试。②动态测试是指在计算机上实际运行程序进行软件测试，一般采用白盒测试和黑盒测试方法。白盒测试也称为结构测试，主要用于软件单元测试中。它的主要思想是，将程序看作是一个透明的白盒，测试人员完全清楚程序的结构和处理算法，按照程序内部逻辑结构设计测试用例，检测程序中的主要执行通路是否都能按预定要求正确工作。白盒测试方法主要有控制流测试、数据流测试和程序变异测试等。另外，使用静态测试的方法也可以实现白盒测试。白盒测试方法中，最常用的技术是逻辑覆盖，即使用测试数据运行被测程序，考查对程序逻辑的覆盖程度。黑盒测试也称为功能测试，主要用于集成测试、确认测试和系统测试中。黑盒测试将程序看作是一个不透明的黑盒，完全不考虑(或不了解)程序的内部结构和处理算法，而只检查程序功能是否能按照 SRS 的要求正常使用，程序是否能适当地接收输入数据并产生正确的输出信息，程序运行过程中能否保持外部信息(例如，文件和数据库等)的完整性等。

章：信息系统工程 节：数据工程 知识点：数据运维

● 在存储管理中，(13)的功能主要是添加或删除存储节点，编辑存储节点的信息，设定某类型存储资源属于某个节点，或者设定这些资源比较均衡地存储到节点上。

- (13) A. 资源调度管理
B. 存储资源管理
C. 负载均衡管理
D. 安全管理

【参考答案】A

【解析】

表 存储管理的主要内容

管理	主要内容
资源调度管理	资源调度管理的功能主要是添加或删除存储节点，编辑存储节点的信息，设定某类型存储资源属于某个节点，或者设定这些资源比较均衡地存储到节点上。它包含存储控制、拓扑配置以及各种网络设备如集线器、交换机、路由器和网桥等的故障隔离
存储资源管理	存储资源管理是一类应用程序，它们管理和监控物理和逻辑层次上的存储资源，从而简化资源管理，提高数据的可用性。被管理的资源包括存储硬件如 RAID、磁带以及光盘库。存储资源管理不仅包括监控存储系统的状况、可用性、性能以及配置情况，还包括容量和配置管理以及事件报警等，从而提供优化策略
负载均衡管理	负载均衡是为了避免存储资源由于资源类型、服务器访问频率和时间不均衡造成浪费或形成系统瓶颈而平衡负载的技术
安全管理	存储系统的安全主要是防止恶意用户攻击系统或窃取数据。系统攻击大致分为两类：一类以扰乱服务器正常工作为目的，如拒绝服务攻击 DoS 等；另一类以入侵或破坏服务器为目的，如窃取数据、修改网页等

章：信息系统工程 节：系统集成 知识点：网络集成

● 在网络集成体系框架中，(14)的主要任务是调度和管理网络资源，并为网络用户提供统一、透明使用网络资源的手段。

- (14) A. 网管子系统

- B. 服务器子系统
- C. 网络操作系统
- D. 服务子系统

【参考答案】C

【解析】

(1) 传输子系统。传输是网络的核心，是网络信息的“公路”和“血管”。传输线路带宽的高低不仅体现了网络的通信能力，也体现了网络的现代化水平。并且，传输介质在很大程度上也决定了通信的质量，从而直接影响到网络协议。目前主要的传输介质分为无线传输介质和有线传输介质两大类。

(2) 交换子系统。网络按所覆盖的区域可分为局域网、城域网和广域网，由此网络交换也可以分为局域网交换技术、城域网交换技术和广域网交换技术。

(3) 安全子系统。由于网络的发展，安全问题一直是网络研究和应用的热点。网络安全主要关注的内容包括：使用防火墙技术，防止外部的侵犯；使用数据加密技术，防止任何人从通信信道窃取信息；访问控制，主要是通过设置口令、密码和访问权限保护网络资源。

(4) 网管子系统。对于任何网管子系统来说，关键的任务便是保证网络的良好运行。由于网络规模的扩大，通常会出现网络“瓶颈”问题，使系统的速度变慢。网管的职责便是找出瓶颈并解决它。

(5) 服务器子系统。服务器是网络中的关键设备。服务器的作用就是向工作站提供处理器内存、磁盘、打印机、软件数据等资源和服务，并负责协调管理这些资源。

(6) 网络操作系统。网络操作系统的主要任务是调度和管理网络资源，并为网络用户提供统一、透明使用网络资源的手段。网络资源主要包括网络服务器、工作站、打印机、网桥、路由器、交换机、网关、共享软件和应用软件等。

(7) 服务子系统。网络服务是网络应用最核心的问题。带宽再高的网络，如果没有好的网络服务，就不能发挥网络的效益。网络服务主要包括互联网服务、多媒体信息检索、信息点播、信息广播、远程计算和事务处理以及其他信息服务等。

章：信息系统工程 节：安全工程 知识点：工程体系架构

● ISSE 将信息安全系统工程实施过程分解为：(15) 三个基本的部分。

- (15) A. 工程过程、风险过程和保证过程
B. 工程过程、风险过程和支持过程
C. 工程过程、保证过程和支持过程
D. 风险过程、保证过程和支持过程

【参考答案】A

【解析】

ISSE 将信息安全系统工程实施过程分解为：工程过程(Engineering Process)、风险过程(Risk Process)和保证过程(Assurance Process)三个基本的部分。

章：组织通用治理 节：组织战略 知识点：组织战略要点

● 当组织较为满意过去的运行绩效和方法，选择延续基本相同的产品和服务时，一般选用(16)。

- (16) A. 发展型战略
B. 稳定型战略
C. 复合型战略
D. 成本领先战略

【参考答案】B

【解析】

常见的组织总体战略类型主要包括：

●发展型战略：是指组织从现有战略基础水平上向更高一级的目标发展的战略。组织可根据其战略定位和实际情况选择不同的发展型战略。

●稳定型战略：是指组织由于其运行环境和内部条件的限制，在整个战略期内基本保持战略起点的运行绩效范围和水平的一种战略。这是一种风险相对较低的战略。当组织较为满意过去的运行绩效和方法，选择延续基本相同的产品和服务时，可以采取这类战略。

●紧缩型战略：是指组织从当前战略运行领域和基础水平收缩和撤退，与战略起点偏离较大的一种运行战略。紧缩性战略是一种消极的发展战略，一般作为短期性的过渡战略。

●其他类型战略：组织的总体战略还包括复合型战略、联盟战略、成本领先战略、差异化战略、集中化战略等。

章：组织通用管理 节：市场营销 知识点：营销基础

● 主要的市场营销组合工具称为市场营销的 4P，其中不包括：(17)。

- (17) A. 计划 (Plan)
B. 产品 (Product)
C. 渠道 (Place)
D. 促销 (Promotion)

【参考答案】A

【解析】

主要的市场营销组合工具称为市场营销的 4P：产品 (Product)、定价 (Price)、渠道 (Place) 和促销 (Promotion)。

章：法律法规与标准规范 节：法律法规 知识点：政府采购法

● 根据《中华人民共和国政府采购法》，(18) 应作为政府采购的主要方式。

- (18) A. 公开招标
B. 邀请招标
C. 竞争性谈判
D. 询价

【参考答案】A

【解析】

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十六条，政府采购采用以下方式：

- (一) 公开招标；
(二) 邀请招标；
(三) 竞争性谈判；
(四) 单一来源采购；
(五) 询价；
(六) 国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

章：项目管理概论 节：项目基本要素 知识点：项目内外部运行环境

● 下面 (19) 不属于组织过程资产。

- (19) A. 政策和流程
B. 项目团队成员、主题专家和其他员工的隐性知识

- C. 对设施访问、数据保护、保密级别和专有秘密的程序和实践
- D. 组织文化

【参考答案】D

【解析】

组织过程资产包括：

- 过程资产：包括工具、方法论、方法、模板、框架、模式或 PMO 资源。
- 治理文件：包括政策和流程。
- 数据资产：包括以前项目的数据库、文件库、度量指标、数据和工件。
- 知识资产：包括项目团队成员、主题专家和其他员工的隐性知识。
- 安保和安全：包括对设施访问、数据保护、保密级别和专有秘密的程序和实践等。

章：项目管理概论 节：项目基本要素 知识点：组织系统

- (20) 直接管理和控制项目。项目理由 PMO 指定并向其报告。

- (20) A. 支持型 PMO
B. 控制型 PMO
C. 领导型 PMO
D. 指令型 PMO

【参考答案】D

【解析】

PMO 有如下几种不同类型：

- 支持型：支持型 PMO 担当顾问的角色，向项目提供模板、最佳实践、培训，以及来自其他项目的信息和经验教训。这种类型的 PMO 其实就是一个项目资源库，对项目的控制程度很低。
- 控制型：控制型 PMO 不仅给项目提供支持，而且通过各种手段要求项目服从，这种类型的 PMO 对项目的控制程度属于中等。他可能要求项目：一是采用项目管理框架或方法论；二是使用特定的模板、格式和工具；三是遵从治理框架。
- 指令型：指令型 PMO 直接管理和控制项目。项目理由 PMO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。

PMO 的一个主要职能是通过各种方式向项目经理提供支持，包括：①对 PMO 所辖全部项目的共享资源进行管理；②识别和制定项目管理方法、最佳实践和标准；③指导、辅导、培训和监督；④通过项目审计，监督项目对项目管理标准、政策、程序和模板的合规性；⑤制定和管理项目政策、程序、模板及其他共享的文件（组织过程资产）；⑥对跨项目的沟通进行协调等。

章：项目管理概论 节：价值驱动的项目管理知识体系 知识点：项目管理过程组

- 下面有关项目管理过程组的描述，不正确的是：(21)。

- (21) A 项目管理过程组是为了达成项目的特定目标，对项目管理过程进行逻辑上的分组
B. 项目管理过程组不同于项目阶段
C. 过程组中的各个过程会在每个阶段按需要重复开展
D. 在适应型和高度适应型生命周期中，过程组之间相互作用的方式是相同的

【参考答案】D

【解析】

项目管理过程组是为了达成项目的特定目标，对项目管理过程进行的逻辑上的分组。项目管理过程组不同于项目阶段：①项目管理过程组是为了管理项目，针对项目管理过程进行逻辑上的划分；②项目阶段是项目从开始到结束所经历的一系列阶段，是一组具有逻辑关系的项目活动的集合，通常以一个或多个可交付成果的完成为结束标志。

一个过程组的输出通常成为另一个过程组的输入，或者成为项目或项目阶段的可交付成

果。

过程组中的各个过程会在每个阶段按需要重复开展，直到达到该阶段的完工标准。在适应型和高度适应型生命周期中，过程组之间相互作用的方式会有所不同。

章：项目立项管理 节：项目可行性研究 知识点：可行性研究的内容

● 经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括支出分析、收益分析、收益投资比、投资回报分析以及敏感性分析等。其中，(22)不属于非一次性支出。

- (22) A. 人员工资及福利
C. 差旅费

- B. 消耗品支出
D. 软、硬件租金

【参考答案】C

【解析】

支出分析：信息系统项目的支出可分为一次性支出和非一次性支出两类。

● 一次性支出：包括开发费、培训费、差旅费、初始数据录入、设备购置费等费用。

● 非一次性支出：包括软、硬件租金、人员工资及福利、水电等公用设施使用费，以及其他消耗品支出等。

章：项目立项管理 节：项目可行性研究 知识点：初步可行性研究

● 下面有关辅助(功能)研究和可行性研究的描述，不正确的是：(23)。

- (23) A. 辅助(功能)研究包括项目的所有方面
B. 辅助(功能)研究只能作为初步可行性研究、详细可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助
C. 可行性研究的方法有经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等
D. 初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本与详细可行性研究相同

【参考答案】A

【解析】

辅助(功能)研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面，并且只能作为初步可行性研究、详细可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助。

章：项目整合管理 节：管理基础 知识点：

● 下面(24)不是整合管理的目标。

- (24) A. 资源分配
B. 平衡竞争性需求
C. 研究各种备选方法
D. 执行过程以实现项目目标

【参考答案】D

【解析】

项目整合管理包括识别、定义、组合、统一和协调项目管理过程组的各个过程和项目管理活动。在项目管理中，整合管理兼具统一、合并、沟通和建立联系的性质，项目整合管理贯穿项目始终。项目整合管理的目标包括：①资源分配；②平衡竞争性需求；③研究各种备选方法；④裁剪过程以实现项目目标；⑤管理各个项目管理知识领域之间的依赖关系。

章：项目整合管理 节：指导与管理项目工作 知识点：输出

● 为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动属于(25)。

- (25) A. 纠正措施
B. 预防措施
C. 缺陷补救
D. 更新

【参考答案】A

【解析】

更请求一般包括：

- 纠正措施：为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。
- 预防措施：为确保项目工作未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动。
- 缺陷补救：为了修正不一致产品或产品组件，而进行的有目的的活动。
- 更新：对正式受控的项目文件或计划进行变更，以反映修改、增加的意见或内容。

章：项目整合管理 节：结束项目或阶段 知识点：

- 对于项目整合管理，在整个项目期间开展的过程不包括（26）。

- (26) A. 指导与管理项目工作
B. 管理项目知识
C. 实施整体变更控制
D. 结束项目或阶段

【参考答案】D

【解析】

结束项目或阶段是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程。本过程的主要作用：①存档项目或阶段信息，完成计划的工作；②释放组织团队资源以展开新的工作。它仅开展一次或仅在项目或阶段的结束点开展。

章：项目范围管理 节：管理基础 知识点：产品范围和项目范围

- 下面有关产品范围和项目范围的描述，不正确的是：（27）。

- (27) A. 产品范围指某项产品、服务或成果所具有的特征和功能
B. 项目范围是为交付具有规定特性与功能的产品、服务或成果而必须完成的工作
C. 产品范围包括项目范围
D. 项目范围是否完成依据项目管理计划来衡量

【参考答案】C

【解析】

产品范围：指某项产品、服务或成果所具有的特征和功能。产品范围的完成情况是根据产品需求来衡量的。“需求”是指根据特定协议或其他强制性规范，产品、服务或成果必须具备的条件或能力。

项目范围：包括产品范围，是为交付具有规定特性与功能的产品、服务或成果而必须完成的工作。项目范围的完成情况是根据项目管理计划来衡量的。

章：项目范围管理 节：创建 WBS 知识点：工具与技术

- 进行 WBS 分解的正确顺序是：（28）。

- ①识别和分析可交付成果及相关工作；
- ②确定 WBS 的结构和编排方法；
- ③自上而下逐层细化分解；
- ④为 WBS 组成部分制定和分配标识编码；

⑤核实可交付成果分解的程度是否恰当

- (28) A. ①②③④⑤
B. ②①③④⑤
C. ①②④③⑤
D. ②①④③⑤

【参考答案】A

【解析】

要把整个项目工作分解为工作包，通常需要开展如下活动：①识别和分析可交付成果及相关工作；②确定 WBS 的结构和编排方法；③自上而下逐层细化分解；④为 WBS 组成部分制定和分配标识编码；⑤核实可交付成果分解的程度是否恰当。

章：项目范围管理 节：确认范围 知识点：

● 项目干系人进行范围确认时，一般需要检查的问题不包括（29）。

- (29) A. 可交付成果是否是确定的、可确认的
B. 是否有明确的质量标准
C. 项目范围有没有遗漏或错误
D. 项目范围的风险是否可控制

【参考答案】D

【解析】

项目干系人进行范围确认时，一般需要检查以下 6 个方面的问题：

- 可交付成果是否是确定的、可确认的。
- 每个可交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否有明确的、可辨别的事件，例如，客户的书面认可等。
- 是否有明确的质量标准：可交付成果的交付不但要有明确的标准标志，而且要有是否按照要求完成的标准，可交付成果和其标准之间是否有明确联系。
- 审核和承诺是否有清晰的表达：项目发起人必须正式同意项目的边界，项目完成的产品或者服务，以及项目相关的可交付成果。项目团队必须清楚地了解可交付成果是什么。所有的这些表达必须清晰，并取得一致的同意。
- 项目范围是否覆盖了需要完成的产品或服务的所有活动，有没有遗漏或错误。
- 项目范围的风险是否太高：管理层是否能够降低风险发生时对项目的影响。

章：项目进度管理 节：定义活动 知识点：输出

● 活动定义的不输出包括：（30）。

- (30) A. 活动清单
B. 里程碑清单
C. 项目进度网络图
D. 变更请求

【参考答案】C

【解析】

活动定义的不输出：

1. 活动清单
2. 活动属性
3. 里程碑清单
4. 变更请求

5. 项目管理计划(更新)

●进度基准

●成本基准

章：项目进度管理 节：制定进度计划 知识点：工具与技术

● 某项目包含 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 共 10 个活动，各活动历时与逻辑关系如下表所示，施工过程中，活动 B 延期 3 天，项目总工期（31）。


活动名称	活动历时（天）	前置活动
A	2	--
B	2	A
C	3	A
D	4	A
E	3	B
F	4	C、D
G	4	E、F
H	3	G
I	2	G
J	1	H、I

- (31) A. 不变
B. 延后 1 天
C. 延后 2 天
D. 延后 3 天

【参考答案】A

【解析】

根据题意，绘制出如下网络图，由此可知，项目总工期 18 天，B 的自由时差 0，总时差为 3 天，如 B 延期 3 天，总工期不变。

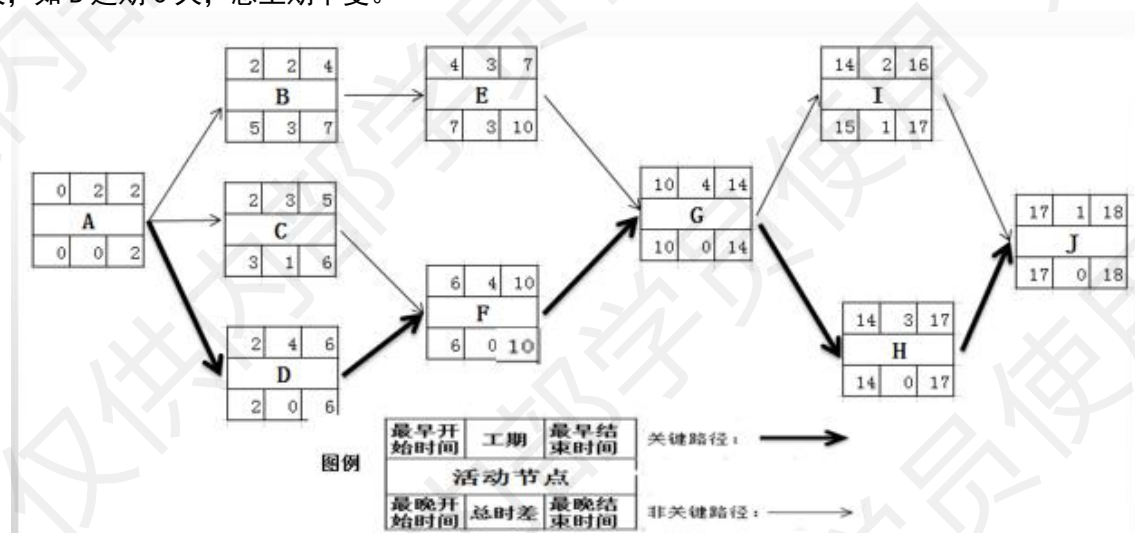

章：项目进度管理 节：估算活动持续时间 知识点：工具与技术

● 关于估算活动持续时间工具的描述，不正确的是：(32)。

- (32) A. 类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低
B. 参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性，不适用于估算整个项目
C. 应急储备包含在项目基准中
D. 管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险，它不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分

【参考答案】B

【解析】

● 类比估算

类比估算是使用一种类似活动或项目的历史数据，来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。类比估算以过去类似项目的参数值（如持续时间、预算、规模、重量和复杂性等）为基础，来估算未来项目的同类参数或指标。在估算持续时间时，类比估算技术以过去类似项目的实际持续时间为依据，来估算当前项目的持续时间。

相对于其他估算技术，类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。可以针对整个项目或项目中的某个部分，进行类比估算。类比估算可以与其他估算方法联合使用。如果以往活动是本质上而不是表面上类似，并且从事估算的项目团队成员具备必要的专业知识，那么类比估算就最为可靠。

● 参数估算

参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术。参数估算是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量（如建筑施工中的平方英尺），来估算诸如成本、预算和持续时间等活动参数。参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可与其他估算方法联合使用。

● 三点估算

通过考虑估算中的不确定性和风险，可以提高活动持续时间估算的准确性。PERT 使用 3 种估算值来界定活动持续时间的近似区间。

● 储备分析

储备分析：储备分析用于确定项目所需的应急储备量和管理储备。①应急储备：在进行持续时间估算时，须考虑应急储备应对进度方面的不确定性。应急储备是包含在进度基准中的一段持续时间，应急储备与“已知-未知”风险相关，用来应对已经接受的已识别风险，应急储备可取活动持续时间估算值的某一百分比或某一固定的时间段，亦可把应急储备从各个活动中剥离出来后汇总。应该在项目进度文件中清楚地列出应急储备，并随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备。②管理储备：管理储备是为管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险，它不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分。依据合同条款，使用管理储备可能需要变更进度基准。

章：项目成本管理 节：规划成本管理 知识点：输出

● 根据活动范围和项目规模，设定成本估算向上或向下取整的程度，这属于成本管理计划中的(33)。

- (33) A. 计量单位 B. 精确度
C. 准确度 D. 控制临界值

【参考答案】B

【解析】

在成本管理计划中一般需要规定：

●计量单位：需要规定每种资源的计量单位，例如用于测量时间的人时数、人天数或周数，用于计量数量的米、升、吨、千米、立方码，或者用货币表示的总价。

●精确度：根据活动范围和项目规模，设定成本估算向上或向下取整的程度（例如 995.59 元取整为 1000 元）。

●准确度：为活动成本估算规定一个可接受的区间（如正负 10%，其中可能包括一定数量的应急储备）。

●组织程序链接：工作分解结构为成本管理计划提供了框架，以便据此规范地开展成本估算、预算和控制，在项目成本核算中使用的 WBS 组成部分，称为控制账户（CA），每个控制账户都有唯一的编码或账号，直接与组织的会计制度关联。

●控制临界值：需要规定偏差临界值，用于监督成本绩效，它是在需要采取某种措施前允许出现的最大差异，通常用偏离基准计划的百分数来表示。

●绩效测量规则：需要规定用于绩效测量的挣值管理（EVM）规则。例如，成本管理计划应该：①定义 WBS 中用于绩效测量的控制账户；②确定拟用的 EVM 技术（如加权里程碑法、固定公式法、完成百分比法等）；③规定跟踪方法以及用于计算项目完工估算（EAC）的 EVM 公式，该公式计算出的结果可用于验证通过自下而上方法得出的完工估算。

●报告格式：需要规定各种成本报告的格式和编制频率。

●其他细节：关于成本管理活动的其他细节包括：对战略筹资方案的说明；处理汇率波动的程序；记录项目成本的程序等。

章：项目成本管理 节：估算成本 知识点：

●关于成本估算的描述。不正确的是（34）。

（34）A. 成本估算过程的主要作用是确定项目所需的资金

B. 成本估算需要在整个项目期间定期开展

C. 成本估算是对完成活动所需资源的可能成本进行的量化评估，是在某特定时点根据已知信息所做出的成本预测

D. 成本估算结果只能用某种货币单位来表示

【参考答案】D

【解析】

估算成本是对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程。本过程的主要作用是确定项目所需的资金。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。

成本估算是对完成活动所需资源的可能成本进行的量化评估，是在某特定时点根据已知信息所做出的成本预测。在估算成本时，需要识别和分析可用于启动与完成项目的备选成本方案；需要权衡备选成本方案并考虑风险，如比较自制成本与外购成本、购买成本与租赁成本及多种资源共享方案，以优化项目成本。

通常用某种货币单位进行成本估算，但有时也可采用其他计量单位，如人时数或人天数，以消除通货膨胀的影响，便于成本比较。

章：项目成本管理 节：成本控制 知识点：工具与技术

●某项目完工预算为 1000 万元，工期 6 个月。到第 3 个月末时，由于某些特殊原因，实际支出 400 万元，成本绩效指数为 0.8，假设此情况一直持续到项目结束，则完工估算（EAC）为（35）万元。

（35）A. 1250

B. 1080

C. 1000

D. 800

【参考答案】A

【解析】

由题目可知，完工预算 $BAC=1000$ 万元，实际成本 $AC=400$ 万元，成本绩效指数 $CPI=0.8$ 。可以计算得出： $EV=CPI*AC=0.8*400=320$ 万元。

后续不再发生成本偏差，完工估算 $EAC=AC+(BAC-EV)/CPI$ 或 $=BAC/CPI=1000/0.8=1250$ 万元。

章：项目质量管理 节：管理基础 知识点：质量与项目质量

● 统计相关的术语中，(36) 指的是保证过程中不出现错误。

- (36) A. 预防
B. 检查
C. 公差
D. 控制界限

【参考答案】A

【解析】

根据不同的项目和行业领域，项目团队可能需要具备统计控制过程方面的实用知识，以便评估控制质量的输出中所包含的数据。项目管理团队应了解的与统计相关的术语包括：①“预防”——保证过程中不出现错误；“检查”——保证错误不落到客户手中；②“公差”——结果的可接受范围；“控制界限”——在统计意义上稳定的过程或过程绩效的普通偏差的边界。

章：项目质量管理 节：管理质量 知识点：

● 管理质量过程的主要作用包括：(37)。

- ①提高实现质量目标的可能性
②识别无效过程和导致质量低劣的原因
③使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态
④确定项目输出是否达到预期目的，满足所有适用标准、要求、法规和规范

- (37) A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

【参考答案】A

【解析】

管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。本过程的主要作用：①提高实现质量目标的可能性；②识别无效过程和导致质量低劣的原因；③使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。管理质量过程需要在整个项目期间开展。

章：项目质量管理 节：管理质量 知识点：工具与技术

● 在管理质量过程的数据表现技术中，(38) 可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。

- (38) A. 亲和图
B. 直方图
C. 矩阵图
D. 散点图

【参考答案】A

【解析】

适用于管理质量过程的数据表现技术主要包括：

●亲和图：亲和图可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。

●因果图：因果图又称“鱼骨图”“why-why 分析图”和“石川图”，将问题陈述的原因

分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。

●流程图：流程图展示了引发缺陷的一系列步骤。

●直方图：直方图是一种展示数字数据的条形图，可展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。

●矩阵图：矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

●散点图：散点图是一种展示两个变量之间关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。

章：项目质量管理 节：控制质量 知识点：输出

●（39）不属于控制质量过程的输出。

- （39）A. 质量控制测量结果
B. 质量报告
C. 工作绩效信息
D. 变更请求

【参考答案】B

【解析】

质量控制过程的输出包括：

1. 工作绩效信息
2. 质量控制测量结果
3. 核实的可交付成果
4. 变更请求
5. 项目管理计划(更新)
6. 项目文件(更新)

章：项目资源管理 节：管理基础 知识点：相关术语和定义

●在马斯洛需求层次中，（40）被认为是基本的需求。

①生理需求 ②安全需求 ③社会交往的需求 ④受尊重的需求

- （40）A. ①
B. ①②
C. ①②③
D. ①②③④

【参考答案】D

【解析】

马斯洛需求层次理论。马斯洛需求层次理论是一个5层的金字塔结构，如图下图所示，表示人们的行为受到一系列需求的引导和刺激，在不同的层次满足不同的需求，才能达到激励的作用。



图 马斯洛的需求层次理论

●生理需求 (Physiological needs): 对衣食住行等需求都是生理需求, 这类需求的级别最低, 人们在转向较高层次的需求之前, 总是尽力满足这类需求。常见的激励措施: 员工宿舍、工作餐、工作服、班车、工资、补贴、奖金等。

●安全需求 (Safety needs): 包括对人身安全、生活稳定、不致失业以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需求。和生理需求一样, 在安全需求没有得到满足之前, 人们一般不追求更高层次的需求。常见的激励措施: 养老保险、医疗保障、长期劳动合同、意外保险、失业保险等。

●社会交往的需求 (Love and belonging needs): 包括对友谊、爱情以及隶属关系的需求。当生理需求和安全需求得到满足后, 社交需求就会凸显, 进而产生激励作用。这些需求如果得不到满足, 就会影响员工的精神, 导致高缺勤率、低生产率、对工作不满及情绪低落。常见的激励措施: 定期员工活动、聚会、比赛、俱乐部等。

●受尊重的需求 (Esteem needs): 包括自尊心和荣誉感。荣誉来自别人, 自尊来自自己。常见的激励措施: 荣誉性的奖励, 形象、地位提升, 颁发奖章, 作为导师培训别人等。

●自我实现的需求 (Self-actualization): 实现自己的潜力, 发挥个人能力到最大程度, 使自己越来越成为自己所期望的人物。达到自我实现境界的人, 必须干与其能力相称的工作, 这样才会使他们感到最大的快乐。常见的激励措施是: 给他更多的空间让他负责、让他成为智囊团、参与决策、参与组织的管理会议等。

在马斯洛需求层次中, 底层的 4 种需求即生理、安全、社会交往、受尊重被认为是基本的需求, 而自我实现是最高层次的需求。

章: 项目资源管理 节: 建设团队 知识点:

●(41) 过程的主要作用是, 改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。

- (41) A 获取资源
- B. 建设团队
- C. 管理团队
- D. 控制资源

【参考答案】B

【解析】

资源管理包含以下过程:

(1) 规划资源管理: 定义如何估算、获取、管理和利用实物以及团队项目资源。本过程的主要作用是, 根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。

(2) 估算活动资源: 估算执行项目所需的团队资源, 材料、设备和用品的类型和数量。本过程的主要作用是明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。

(3) 获取资源：获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料用品和其他资源。本过程的主要作用：一是概述和指导资源的选择；二是将选择的资源分配给相应的活动。

(4) 建设团队：提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围提高绩效。本过程的主要作用是，改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。

(5) 管理团队：跟踪团队成员工作表现，提供反馈 解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效。本过程的主要作用是，影响团队行为、管理冲突以及解决问题。

(6) 控制资源：确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施。本过程的主要作用：一是确保所分配的资源适时、适地可用于项目。二是资源在不再需要时被释放。

章：项目资源管理 节：规划资源管理 知识点：输出

● 下面有关团队章程的描述，不正确的是：(42)。

(42) A. 团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件

B. 团队章程包括团队价值观、沟通指南、决策标准和过程、冲突处理过程、会议指南和团队共识等

C. 由公司高层参与制订的团队章程可发挥最佳效果

D. 团队章程可定期审查和更新

【参考答案】C

【解析】

团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。团队章程包括：团队价值观、沟通指南、决策标准和过程、冲突处理过程、会议指南和团队共识。

团队章程对项目团队成员的可接受行为确定了明确的期望，尽早认可并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力；借助诸如行为规范、沟通、决策、会议礼仪等方面的讨论，团队成员可以了解彼此重要的价值观。由团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果，所有项目团队成员都分担责任，确保遵守团队章程中规定的规则；可定期审查和更新团队章程，确保团队成员始终了解团队基本规则，并指导新成员融入团队。

章：项目资源管理 节：管理团队 知识点：工具与技术

● 影响冲突解决方法的因素不包括：(43)。

(43) A. 冲突的重要性与激烈程度

B. 解决冲突的紧迫性

C. 涉及冲突的人员的相对权力

D. 冲突的原因

【参考答案】D

【解析】

项目经理解决冲突的能力往往决定其管理项目团队的成败。不同的项目经理可能采用不同的解决冲突方法。影响冲突解决方法的因素包括：①冲突的重要性与激烈程度；②解决冲突的紧迫性；③涉及冲突的人员的相对权力；④维持良好关系的重要性；⑤永久或暂时解决冲突的动机等。

章：项目沟通管理 节：管理基础 知识点：沟通模型

● 沟通模型包含 5 种状态中，(44) 是整个过程中最难的一环。

(44) A. 已收到

B. 已理解

C. 已认可

D. 已转化为积极的行动

【参考答案】D

【解析】

沟通模型包含 5 种状态：已发送、已收到、已理解、已认可、已转化为积极的行动。

●已发送：信息已发送。当你传送信息给他人，这并不表示对方已经读取或听到了，电子邮件和电话也只是帮助我们快速传递信息却不能保证对方一定已经读取。

●已收到：对方信息已收到。但这并不表示对方有意图去读取、理解或解决信息。

●已理解：正确地消化和理解信息中的内容是简单接收信息中关键的一环。通常理解需要一定的上下文背景知识，需要对其中某些内容提出问题，或向发送者进行确认或澄清等步骤。

●已认可：理解了传达的信息并不代表对方已同意这个观点。或许对方明白了发送者的意思，但完全不同意。所以在两个聪明的、有主见的人之间达成一致既复杂又耗时，尤其是两个人的观点不能清晰地对方阐述的时候。因此，达成一致仍然是做出项目决策和有效沟通的关键一环。

●已转化为积极的行动：正确理解和达成一致的认可比较难，但更加困难的是让对方转化为实际的、积极的行动，而且是方向正确无误的行动。这是整个过程中最难的一环，通常需要反复地沟通，在一定的监督或帮助下才能较好地完成。

章：项目沟通管理 节：管理沟通 知识点：输出

● 管理沟通的输出不包括（45）。

- （45）A. 项目沟通记录
B. 项目报告
C. 项目管理计划（更新）
D. 组织过程资产（更新）

【参考答案】B

【解析】

管理沟通的输出有：

1. 项目沟通记录；
2. 项目管理计划（更新）；
3. 项目文件（更新）；
4. 组织过程资产（更新）。

章：项目风险管理 节：管理基础 知识点：风险的属性

● 风险的可变性含义不包括：（46）。

- （46）A. 风险性质的变更
B. 风险后果的变更
C. 风险发生概率的变化
D. 出现新风险

【参考答案】C


【解析】

风险的可变性含义包括：

- 风险性质的变化。
- 风险后果的变化。
- 出现新风险。

章：项目风险管理 节：识别风险 知识点：

● 下图是（47）过程的数据流向图。

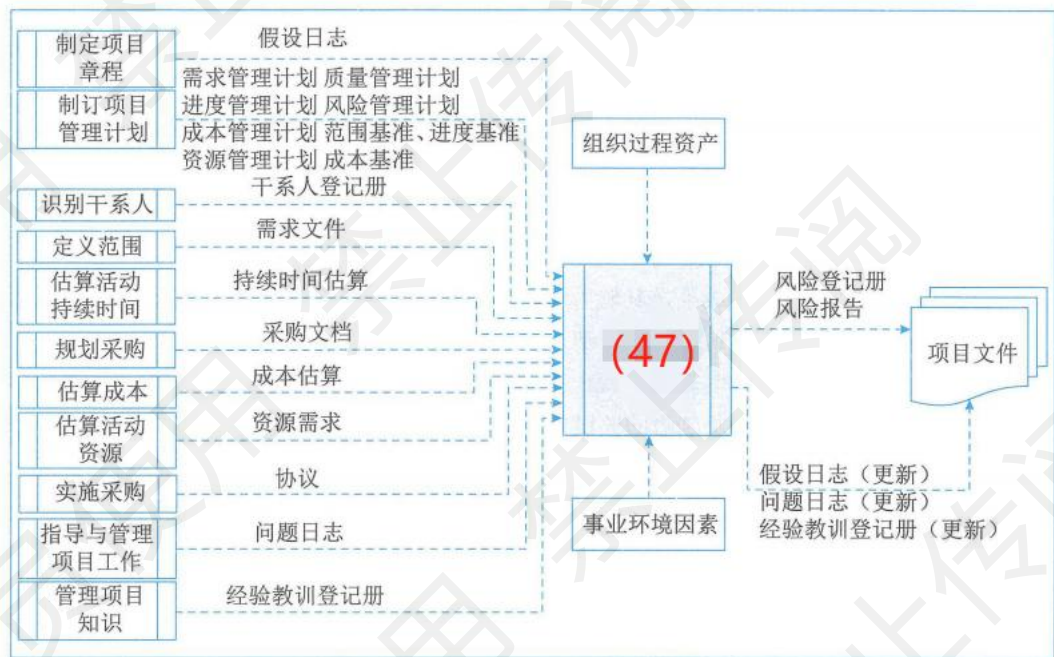

- (47) A. 识别风险
B. 风险定性分析
C. 风险定量分析
D. 监督风险

【参考答案】A

【解析】

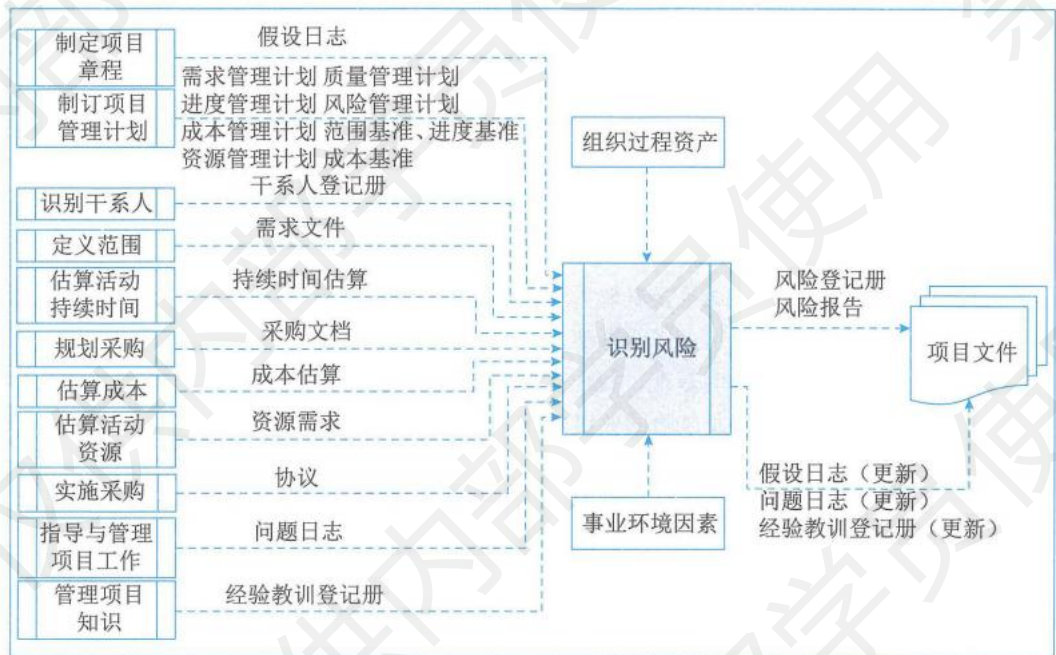


图 识别风险过程的数据流向图

章：项目风险管理 节：规划风险管理 知识点：输出

●风险管理计划的内容不包括：（48）。

- （48）A. 方法论
B. 风险类别
C. 风险应对策略
D. 风险概率和影响

【参考答案】C

【解析】

风险管理计划是项目管理计划的组成部分，描述如何安排与实施风险管理活动。风险管理计划内容主要包括：

- 风险管理策略。
- 方法论。
- 角色与职责。
- 资金。
- 时间安排。
- 风险类别。
- 干系人风险偏好。
- 风险概率和影响。
- 概率和影响矩阵。
- 报告格式。
- 跟踪。

章：项目风险管理 节：实施风险应对 知识点：

●下面有关风险管理过程的描述，不正确的是：（49）。

- （49）A. 规划风险的应对需要在整个项目期间开展
B. 实施风险应对只在项目执行阶段开展
C. 监督风险需要在整个项目期间开展
D. 监督风险保证项目决策是在整体项目风险和单个项目风险当前信息的基础上进行

【参考答案】B

【解析】

规划风险的应对措施是为了应对项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。本过程的主要作用：①制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法；②分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划中。本过程需要在整个项目期间开展。

实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程。本过程的主要作用：①确保按计划执行商定的风险应对措施；②管理整体项目风险入口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。本过程需要在整个项目期间开展。

监督风险是在整个项目期间，监督风险应对计划的实施，并跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。本过程的主要作用是，保证项目决策是在整体项目风险和单个项目风险当前信息的基础上进行。本过程需要在整个项目期间开展。

章：项目风险管理 节：实施定量风险分析 知识点：工具与技术

●某项目投资5万元，有40%概率获得利润10万元，30%概率会亏损6万元（含成本），30%概率既不获利也不亏损。该项目的预期货币价值(EMV)是（50）万元。

- （50）A. -2.8

- B. 2. 2
- C. 5. 7
- D. 4. 2

【参考答案】B

【解析】

$EMV=10*0.4+0*0.3-6*0.3=2.2$ 万元

章：项目采购管理 节：规划采购管理 知识点：输出

● 采购策略的内容不包括：（51）。

- （51）
- A. 交付方法
 - B. 合同支付类型
 - C. 采购报告
 - D. 采购阶段

【参考答案】C

【解析】

采购策略：一旦完成自制或外购分析，并决定从项目外部渠道采购，就应制定一套采购策略。应该在采购策略中规定项目交付方法、具有法律约束力的协议类型，以及如何在采购阶段推动采购进展。

（1）交付方法。对专业服务项目和建筑施工项目应该采用不同的交付方法。

●专业服务项目的交付方法：主要涉及的项目类型包括：买方或服务提供方不得分包、买方或服务提供方可以分包、买方和服务提供方设立合资企业、买方或服务提供方仅充当代表。

●工业或商业施工项目的交付方法：主要涉及的项目类型包括：交钥匙式、设计-建造（DB）、设计-招标-建造（DBB）、设计-建造-运营（DBO）、建造-拥有-运营-转让（BOOT）及其他。

（2）合同支付类型。合同支付类型与项目交付方法无关，需要与采购组织的内部财务系统相协调。它们主要包括以下合同类型及其变种：总价、固定总价、成本加奖励费用、成本加激励费用、工料、目标成本及其他。

- 总价合同适用于工作类型可预知、需求能清晰定义且不太可能变更的情况。
- 成本补偿合同适用于工作不断演进、很可能变更或未明确定义的情况。
- 激励和奖励费用可用于协调买方和卖方的目标。

（3）采购阶段。采购策略也可以包括与采购阶段有关的信息，这种信息可能包括：采购工作的顺序安排或阶段划分、每个阶段的描述，以及每个阶段的具体目标；用于监督的采购绩效指标和里程碑；从一个阶段过渡到下一个阶段的标准；用于追踪采购进展的监督和评估计划；向后续阶段转移知识的过程。

章：项目采购管理 节：控制采购 知识点：输入

● 控制采购的输入不包括（52）。

- （52）
- A. 进度基准
 - B. 采购文档
 - C. 工作绩效数据
 - D. 变更请求

【参考答案】D

【解析】

控制采购的输入：

1. 项目管理计划（●需求管理计划●风险管理计划●采购管理计划●变更管理计划●进

度基准)

- 2. 项目文件
- 3. 采购文档
- 5. 工作绩效数据
- 6. 批准的变更请求
- 7. 事业环境因素
- 8. 组织过程资产

章：项目采购管理 节：项目合同管理 知识点：合同管理过程

● 下面关于合同索赔的描述，正确的是：（53）。

- (53) A. 合同索赔的重要前提条件是合同一方或双方存在违约行为和事实
- B. 对于属于买方的原因造成拖延工期，仅给卖方延长工期
- C. 索赔必须以合同为依据
- D. 不可抗力造成的违约，索赔方不仅可能得到延长工期，还应给予费用补偿

【参考答案】C

【解析】

合同索赔的重要前提条件是合同一方或双方存在违约行为和事实，并且由此造成了损失，责任应由对方承担。对提出的合同索赔，凡属于客观原因造成的延期、属于买方也无法预见到的情况，例如，特殊反常天气达到合同中特殊反常天气的约定条件，卖方可能得到延长工期，但得不到费用补偿。对于属于买方的原因造成拖延工期，不仅应给卖方延长工期，还应给予费用补偿。通通常情况下，合同索赔的起因主要包括两个方面。

(1) 索赔事件造成了项目成本的额外支出或者直接工期损失。

(2) 索赔事件造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于索赔方应承担的行为责任或风险责任。

索赔是合同管理的重要环节，应按以下原则进行索赔。①索赔必须以合同为依据；②必须注意资料的积累；③及时、合理地处理索赔；④加强索赔的前瞻性。

章：项目干系人管理 节：识别干系人 知识点：输出

● 初次完成干系人识别后，干系人登记册的内容不包括（54）。

- (54) A. 干系人身份信息
- B. 干系人评估信息
- C. 干系人分类
- D. 干系人管理策略

【参考答案】D

【解析】

干系人登记册是识别干系人过程的主要输出，记录已识别干系人的信息，主要包括：

● 身份信息：姓名、组织职位、地点、联系方式，以及在项目中扮演的角色。

● 评估信息：主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及干系人最能影响或冲击的项目生命周期阶段。

● 干系人分类：用内部或外部，作用、影响、权力或利益，上级、下级、外围或横向，或者项目经理选择的其他分类模型进行分类的结果等。

章：项目干系人管理 节：监督干系人参与 知识点：

● 监督干系人参与过程的主要作用是（55）。

- (55) A. 项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注
- B. 维持或提升干系人参与活动的效率和效果
- C. 提供与干系人进行有效互动的可行计划
- D. 提高干系人对项目的支持度，并尽可能降低干系人对项目的抵制

【参考答案】B

【解析】

监督干系人参与是监督项目干系人的关系,并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程。本过程的主要作用是,随着项目进展和环境变化,维持或提升干系人参与活动的效率和效果。本过程需要在整个项目期间开展。

章:项目绩效域 节:干系人绩效域 知识点:执行效果检查

● 针对干系人绩效域“支持项目的干系人提高了满意度,并从中收益;反对项目的干系人没有对项目产生负面影响”这一预期目标,检查方法不包括(56)。

- (56) A. 干系人行为
B. 干系人满意度
C. 干系人参与的连续性
D. 干系人相关问题和风险

【参考答案】C

【解析】

表 干系人绩效域的检查方法

预期目标	指标及检查方法
建立高效的工作关系	干系人参与的连续性:通过观察、记录方式,对干系人参与的连续性进行衡量
干系人认同项目目标	变更的频率:对项目范围、产品需求的大量变更或修改可能表明干系人没有参与进来或与项目目标不一致
支持项目的干系人提高了满意度,并从中收益;反对项目的干系人没有对项目产生负面影响	● 干系人行为:干系人的行为可表明项目受益人是否对项目感到满意和表示支持,或者他们是否反对项目 ● 干系人满意度:可通过调研、访谈和焦点小组方式,确定干系人满意度,判断干系人是否感到满意和表示支持,或者他们对项目及其可交付物是否表示反对 ● 干系人相关问题和风险:对项目问题日志和风险登记册的审查可以识别与单个干系人有关的问题和风险

章:项目绩效域 节:开发方法和生命周期绩效域 知识点:绩效要点

● 开发方法中,迭代性和增量性逐渐增加的排序是(57)。

- (57) A. 预测型方法-混合型方法-适应型方法
B. 适应型方法-混合型方法-预测型方法
C. 预测型方法-适应型方法-混合型方法
D. 适应型方法-预测型方法-混合型方法

【参考答案】A

【解析】

开发方法是在项目生命周期内创建产品、服务或结果的方法。不同的行业可能会使用不同的术语来定义开发方法。当前行业普遍认同的三种开发方法是预测型方法、混合型方法和适应型方法。三种方法通常被视为一个频谱,随着迭代性和增量性逐渐增加,从频谱一端的预测型方法到另一端的适应型方法逐渐变化。



章：项目绩效域 节：不确定性绩效 知识点：绩效要点

● (58) 不是不确定性绩效域的绩效要点。

(58) A. 风险 B. 抽象性 C. 复杂性 D. 不确定性的应对方法

【参考答案】B

【解析】

不确定性绩效域的绩效要点包括：

1. 风险；
2. 模糊性；

模糊性有两类，概念模糊性和情景模糊性。概念模糊性，即缺乏有效的理解。当可能出现多个结果时，就会出现情景模糊性。有多种解决方案可以解决情景模糊性的问题，包括：①渐进明细。②实验。③原型法。

3. 复杂性

复杂性是由于人类行为、系统行为和模糊性而造成的难以管理的项目、项目集或其环境的特征，当有许多相互关联的影响以不同的方式表现出来并相互作用时，就会存在复杂性。处理复杂性的方法主要有：(1)基于系统的复杂性。(2)重新构建的复杂性。(3)基于过程的复杂性。处理基于过程的复杂性的方法主要包括：①迭代。②参与。③故障保护。

4. 不确定性的应对方法

(1) 收集信息。(2) 为多种结果做好准备。(3) 集合设计。(4) 增加韧性。

章：配置与变更管理 节：配置管理 知识点：管理活动

● 如需对软件产品进行升级，程序员首先需将待修改代码从(59)中取出放入(59)，其次检出代码段放入(59)，修改完成被检入受控库后，才能被其他程序员检出。

(59) A. 产品库 开发库 受控库 B. 受控库 开发库 产品库
C. 受控库 产品库 开发库 D. 产品库 受控库 开发库

【参考答案】D

【解析】

现以某软件产品升级为例，其过程简述为：

(1) 将待升级的基线（假设版本号为 V2.1）从产品库中取出，放入受控库。

(2) 程序员将欲修改的代码段从受控库中检出（Check out），放入自己的开发库中进行修改。代码被检出后即被“锁定”，以保证同一段代码只能同时被一个程序员修改，如果甲正对其修改，乙就无法 Check out。

(3) 程序员将开发库中修改好的代码段检入（Check in）受控库。检入后，代码的“锁定”被解除，其他程序员可以 Check out 该段代码了。

(4) 软件产品的升级修改工作全部完成后，将受控库中的新基线存入产品库中（软件产品的版本号更新为 V2.2，旧的 V2.1 版并不删除，继续在产品库中保存）。

章：配置与变更管理 节：变更管理 知识点：管理基础

● 依据变更的（ ）分类，变更一般分为重大、重要变更和一般变更。

- (60) A. 迫切性 B. 行业特点
C. 性质 D. 影响范围

【参考答案】C

【解析】

根据变更性质可分为重大变更、重要变更和一般变更，通过不同审批权限进行控制；根据变更的迫切性可分为紧急变更、非紧急变更；根据行业特点分类，如弱电工程行业的常见分类方法为产品（工作）范围变更、环境变更、设计变更、实施变更和技术标准变更。

章：配置与变更管理 节：项目文档管理 知识点：管理基础

● 开发团队的职责定义属于软件文档中的（61）。

- (61) A. 开发文档 B. 产品文档 C. 管理文档 D. 说明文档

【参考答案】C

【解析】

信息系统项目类型的不同，其文档分类的方法不同，不同的组织也会结合自身的管理实践，定义其文档类型。对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。

(1) 开发文档描述开发过程本身，基本的开发文档包括：可行性研究报告和项目任务书、需求规格说明、功能规格说明、设计规格说明（包括程序和数据规格说明、开发计划、软件集成和测试计划、质量保证计划、安全和测试信息等）。

(2) 产品文档描述开发过程的产物，基本的产品文档包括：培训手册、参考手册和用户指南、软件支持手册、产品手册和信息广告。

(3) 管理文档记录项目管理的信息，例如：开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录；软件变更情况的记录；开发团队的职责定义、项目计划、项目阶段报告；配置管理计划。

章：高级项目管理 节：项目集管理 知识点：项目集管理绩效域

● 项目集干系人参与主要活动不包括（62）。

- (62) A. 项目集干系人识别 B. 项目集干系人分析
C. 项目集干系人沟通 D. 项目集干系人监督

【参考答案】A

【解析】

项目集干系人参与是识别和分析干系人需求、管理期望和沟通，以促进干系人认同和支持的绩效域。主要活动包括项目集干系人识别、项目集干系人分析、项目集干系人参与规划、项目集干系人参与和项目集干系人沟通。

章：高级项目管理 节：项目组合管理 知识点：项目组合管理绩效域

● 项目组合风险管理中的四个关键要素不包括（63）。

- (63) A. 风险管理规划 B. 风险评估
C. 风险应对 D. 风险监控

【参考答案】D

【解析】

在项目组合风险管理中有4个关键要素：风险管理规划、风险识别、风险评估和风险应对。

章：高级项目管理 节：组织级项目管理 知识点：OPM 框架要素

● OPM3 基本构成要素不包括（64）。

- (64) A. 用于支持项目组合、项目集和项目管理的最佳实践
B. 能力整合形成最佳实践的路径与关联
C. 可见结果与组织能力间的确定关系
D. 能预测一个或多个绩效指标的人员

【参考答案】D

【解析】

OPM3 包括组织项目管理过程和改进的步骤和阶梯，其基本构成要素包括：

- 用于支持项目组合、项目集和项目管理的最佳实践。
- 能力整合形成最佳实践的路径与关联。
- 可见结果与组织能力间的确定关系。
- 能测量每个结果的一个或多个绩效指标。

章：高级项目管理 节：量化项目管理 知识点：组织级量化管理

- 识别因子与目标结果相关性关系 r 的值为 0.55 时，认为该因子与目标结果（65）关系。

- (65) A. 强相关 B. 较强相关 C. 中度相关 D. 较弱相关

【参考答案】C

【解析】

识别因子与目标结果相关性关系如下：

- 当 $0.8 \leq |r| \leq 1$ 时，认为该因子与目标结果存在强相关关系；
- 当 $0.5 \leq |r| < 0.8$ 时，认为该因子与目标结果存在中度相关关系；
- 当 $0.3 \leq |r| < 0.5$ 时，认为该因子与目标结果存在弱相关关系；
- 当 $0 \leq |r| < 0.3$ 时，认为该因子与目标结果基本不相关。

章：项目管理科学基础 节：运筹学 知识点：项目经济评价

- 某项目的投入和预期利润（单位：万元）如下表所示，贴现率为 10%，则该项目投资动态回收期为（66）（结果保留一位小数）。

	2022	2023	2024	2025	2026
投入	100				
预期利润		50	50	50	50

- (66) A. 2.00 B. 2.26 C. 2.32 D. 2.35

【参考答案】D

【解析】

动态投资回收期 = (累计净现金流量现值出现正值的年份 - 1) + 上一年累计净现金流量现值的绝对值 / 出现正值年份的净现金流量现值

$$= (3-1) + |-100+45.45+41.32|/37.57=2.35$$

章：项目管理科学基础 节：运筹学 知识点：决策分析

- 某商店打算经销一种商品，其进货单价为 20 元，销售价为 25 元。如果每周进货商品本周内售不完，则每件损失 5 元。根据以往的销售情况，每周的销售量可能是 10 件、20 件、30 件、40 件 4 种状态。（进货方案也分进货 10 件、20 件、30 件、40 件 4 种），假如每周销售 10 件、20 件、30 件、40 件的概率分别为 0.1、0.3、0.5、0.1，根据期望值决策法分析，商店的经理应进货（67）件能使利润最大，最大利润是（68）元。

- (67) A. 10 B. 20 C. 30 D. 40
(68) A. 80 B. 90 C. 100 D. 110

【参考答案】 (67) C (68) C

【解析】

进货 10 件的期望值=50*0.1+50*0.3+50*0.5+50*0.1=50 元

进货 20 件的期望值=0*0.1+100*0.3+100*0.5+100*0.1=90 元

进货 30 件的期望值=-50*0.1+50*0.3+150*0.5+150*0.1=100 元

进货 40 件的期望值=-100*0.1+0*0.3+100*0.5+200*0.1=60 元

章：项目管理科学基础 节：运筹学 知识点：线性规划

● 某家具厂有方木材 90 m³，木工板 600 m³，生产书桌和书柜所用材料数量及利润如下表所示。

产品	方木 (m ³)	木工板 (m ³)	利润 (元)
书桌	0.1	2	80
书柜	0.2	1	120
限额	90	600	

在生产计划最优化的情况下，最大利润为 (69) 元。

(69) A. 54000

B. 55000

C. 56000

D. 58000

【参考答案】 C

【解析】

设书桌 x 张，书柜 y 张，则

$0.1x + 0.2y \leq 90$

$2x + y \leq 600$

求 MAX (80x+120y)

显然，x=100，y=400 时可以求得最大值。最大值为 100*80+400*120=56000 元。

章：项目管理科学基础 节：运筹学 知识点：指派问题

● 某公司有 3 个生产同类产品的工厂，生产的产品要运向 4 个城市销售，各工厂的生产量（单位：吨）、各城市的销售量（单位：吨）以及各工厂到各城市的单位运价（百元/吨）见下表中。

城市 工厂	甲	乙	丙	丁	产量（吨）
A	3	12	6	11	34
B	2	10	3	9	18
C	8	6	11	7	42
销量（吨）	16	30	28	20	

适当安排调运方案，最小总运费为 (70) 百元。

(70) A. 512

B. 514

C. 516

D. 518

【参考答案】 B

【解析】

这道题是运筹管理学中的运输问题。可求每列差值最大的方法去指派。

其中，A 工厂供应甲城市 16 吨，供应丙城市 10 吨，供应丁城市 8 吨；B 工厂供应丙城市 18 吨；C 工厂供应乙城市 30 吨，供应丁城市 12 吨；

总运费为：16*3+10*6+8*11+18*3+30*6+12*7=514 百元

章：信息技术发展 节：新一代信息技术及应用 知识点：虚拟现实

● (71) is a computer technology that headsets, sometimes in combination with

physical spaces or multi-projected environments, to generate realistic images, sounds and other sensations that simulate a user's physical presence in a virtual or imaginary environment

- (71) A. Cloud service B. Block chain
C. Internet of things D. Artificial intelligence

【参考答案】A

【解析】

翻译：(71) 是一种计算机技术，它使用头戴式视图器与物理空间或多投影环境结合，通过模拟用户在一个虚拟的或想象的环境中的物理存在感，产生逼真的图像、声音和其他感知。

- (71) A. 虚拟现实 B. 云计算 C. 大数据 D. 互联网+

章：信息技术发展 节：新一代信息技术及应用 知识点：云计算

● (72) Provide users with infrastructure services such as computer capabilities and storage space.

- (72) A. IaaS B. PaaS
C. SaaS D. DaaS

【参考答案】A

【解析】

翻译：(72) IaaS 向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。

- (72) A. 设施即服务 B. 平台即服务 C. 软件即服务 D. 数据即服务

章：项目范围管理 节：定义范围 知识点：

● The main function of the (73) process is to describe the boundaries and acceptance criteria of a product, service, or outcome..

- (73) A. plan Scope Management B. define Scope
C. validate Scope D. control Scope

【参考答案】B

【解析】

翻译：(73) 过程的主要作用是描述产品、服务或成果的边界和验收标准。

- (73) A. 规划范围管理 B. 定义范围
C. 确认范围 D. 控制范围

章：项目采购管理 节：项目合同管理 知识点：合同的类型

● If the scope of work is well-defined and the project design has detailed specifications, (74) should be used.

- (74) A. Fixed-Price Contract
B. Time and Material contract
C. Cost-Reimbursable Contract
D. Cost Plus Incentive Fee

【参考答案】A

【翻译】

● 如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则应使用 (74)。

- (74) A. 总价合同 B. 工料合同
C. 成本补偿合同 D. 成本加激励费用合同

章：配置与变更管理 节：变更管理 知识点：管理基础

● Configuration management is focus on the specification of both the deliverable and the processes; While (75) is focused on identifying, documenting, and approving or rejecting changes to the project documents, deliverable, or baselines.

- (75) A. cost management B. change management
C. configuration management D. capacity management

【参考答案】B

【解析】

翻译：(75)关注可交付成果和过程的规范；而变更管理关注于识别、记录和批准或拒绝对项目文档、可交付成果或基线的更改。

- (75) A. 成本管理 B. 变更管理 C. 配置管理 D. 能力管理

2025 年上半年信息系统项目管理师 下午模拟试题二

章：案例分析 节：案例分析 知识点：

试题一（25分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某科技公司中标了某市社区老年人服务项目，要求在 2023 年年前底全部上线。公司任命了经验丰富的小李为项目经理负责此项目。

项目启动过程中，小李依据项目合同编写了项目章程，在项目章程中明确了项目的主要目标，批准的财务预算、总体里程碑进度计划、主要风险等内容。随后交给公司王总审批后签发。

考虑到该社区中心要求各服务模块分批上线，优先上线“上门送餐服务”模块，同时部分模块要由不同的人员开发，因此，经项目组讨论后决定采用混合型开发方法进行开发此项目。随后小李和团队成员分工制定了范围管理计划、进度管理计划与质量管理计划等，然后整合为项目管理计划。

随后小李投身紧张的开发工作中，在开发过程中，客户不断提出新的需求，小李一边修改需求文件一边安排开发人员进行修改，导致开发工作多次反复。由于项目组对项目工作量估计不足，人手紧张，加上采购的服务器也未按时到货，各成员因经验技能的差异，所负责的工作进度不一，导致项目实施进度严重滞后，团队成员在加班加点的情况下，项目组在公司绩效考核中仍未达标，团队氛围凝重。

【问题 1】（10 分）

请指出本项目整合管理方面存在的问题。

【参考答案】

1. 项目章程不能由项目经理单独编制。
2. 编制项目章程除了参考项目合同，还要参考立项文件、组织过程资产等。
3. 不能由项目团队成员分工制订项目子计划，应与干系人一起共同编制。
4. 未对项目工作量进行合理估算后获取项目所需资源。
5. 未进行有效的团队建设和团队管理。
6. 未开展项目知识管理
7. 变更未走变更流程。
8. 未能有效监控项目工作，采购的服务器未按时到货，项目进度滞后。

【问题 2】（8 分）

结合案例，把下面（1）-（3）的答案填入答题区对应栏内。

采用（1）开发方法的生命周期适用于已经充分了解并明确确定需求的项目；采用（2）生命周期的项目范围通常在项目生命周期的早期确定，但时间及成本会随着项目团队对产品理解的不断深入而定期修改；采用（3）生命周期的项目通过在预定的时间区间内渐进增加产品功能的一系列迭代来产出可交付成果。只有在最后一次迭代之后，可交付成果具有了必要和足够的能力，才能被视为完整的；采用（ ）开发方法的项目又称敏捷型或变更驱动型项目，适合于需求不确定，不断发展变化的项目。

【参考答案】

(1) 预测型 (2) 迭代型 (3) 增量型 (4) 适应型

【问题 3】 (3 分)

结合案例，简述制订项目章程过程的主要作用。

【参考答案】

制订项目章程过程的主要作用：

- ①明确项目与组织战略目标之间的直接联系；
- ②确立项目的正式地位；
- ③展示组织对项目的承诺。

【问题 4】 (4 分)

从候选答案中选择正确选项，将该编号及答案填入答题纸对应栏内。

项目管理计划组件包括 (1)，项目文件包括 (2)。

- A. 项目进度计划 B. 项目生命周期描述 C. 开发方法 D. 质量报告

【参考答案】

(1) B、C (2) A、D

章：案例分析 节：案例分析 知识点：

试题二 (25分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目活动信息如下表所示：

活动名称	紧前活动	工期 (周)	预算 (万元)
A	-	2	3
B	-	3	5
C	A、B	1	2
D	B	4	6
E	C、D	5	7
F	E	2	4
G	D	6	9
H	F、G	3	5
I	G	1	3
J	H、I	2	4

【问题 1】 (4 分)

请写出项目关键路径，并计算项目的总工期。

【问题 2】 (8 分)

假设活动 E 的最乐观工期为 2 周，最悲观工期为 8 周，最可能工期为 5 周，三个估算值服从 β 分布。请计算活动 E 的标准差和期望工期，以及活动后在 6 周后完工的概率。(结果精确到 0.01%)

【问题 3】 (9 分)

假设预算按各活动的工期平均分配，项目执行到第 14 周结束时，项目的实际已发生成本为

35 万，活动 A、B、C、D、E 已经完工，活动 F 完成了一半，活动 G 完成了三分之二，活动 H、I、J 尚未开始。请计算项目的进度偏差和成本偏差，并判断项目此时的执行绩效。


【问题 4】（4 分）

根据问题 3 的项目当前绩效，项目经理可采取何种措施，以确保项目绩效符合计划绩效。

【参考答案】

【问题 1】

项目的网络图如下：

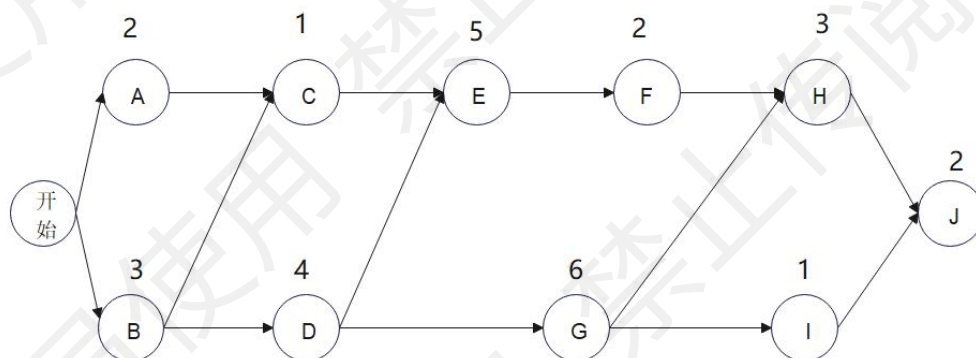

项目的关键路径为：B-D-E-F-H-J，项目的总工期为 19 周。

【问题 2】

E 的期望工期=（最乐观工期+4*最可能工期+最悲观工期）/6=5 周

E 活动的标准差=（最悲观工期-最乐观工期）/6=1 周

因三点估算活动完成概率服从正态分布，6 周为期望工期加一个正的标准差，所以 E 活动 6 周后完成的概率为：

$100\% - 50\% - 68.26\% / 2 = 15.87\%$

【问题 3】

项目执行到第 14 周结束时，各数据如下：

$PV = A + B + C + D + E + F + G + I = 39$ 万元

$EV = A + B + C + D + E + 1/2F + 2/3G = 31$ 万元

$AC = 35$ 万元

$CV = EV - AC = 31 - 35 = -4$ 万元

$SV = EV - PV = 31 - 39 = -8$ 万元

因为 CV 小于 0，所以成本超支，SV 小于 0，所以进度滞后。

【问题 4】

项目经理可采取的措施有：

- 1、在控制成本的前提下进行赶工；
- 2、在控制风险的前提下快速跟进；
- 3、加强质量控制，减少返工，节约成本；
- 4、使用高素质资源，提升生产率。
- 5、使用新技术，提升工作效率。

章：案例分析 节：案例分析 知识点：

试题三（25分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸对应栏内。

【说明】

A 公司是一家知名的电子商务公司，最近启动了一个全新的在线购物平台项目，同时还启动了与在线购物平台相关的物流管理平台、客户管理平台、人力资源管理平台等相关项目，以获取分别管理无法获得的利益。老李被任命为在线购物平台项目经理，并组建了一个由 15 名开发人员组成的团队。李经理任命小陈担任了配置管理的角色。小陈认为配置管理主要就是做好版本管理和配置项的变更管

理，据此，小陈制订了配置管理计划，明确规定了所有配置版本号设为 X.YZ 和 X.Y 两种格式，其中 X.Y 表示配置项为正式状态，X.YZ 表示配置项为修改状态。然后明确了配置项变更处理流程，分配了配置管理权限。

在项目实施过程中，由于软件代码需要频繁的修改，为了工作方便，小陈给各开发小组长开放了所有的配置权限，当有项目组成员提出配置变更请求时，由各小组长直接决定是否批准变更请求。为了防止代码修改冲突，小陈让各小组长在修改某个代码时，直接从产品库剪切到开发库，修改完成后再放回受控制或产品库，同时还强调每次修改完成后，版本号要在原来版本号的基础上加 0.1。在项目进行配置审计时项目经理发现配置管理非常混乱，所有配置项只有最新的版本，部分配置项缺少责任人，功能与需求不一致等。

【问题 1】（8 分）

请结合案例，简要分析该项目在配置管理方面存在的问题。

【参考答案】

- 1、小陈不能单独编制配置管理计划，需要相关干系人参与；
- 2、配置管理计划内容不全面，还应包括配置管理日常活动，配置管理目标和范围等。
- 3、版本管理规定不符合要求。
- 4、配置权限控制存在问题，小陈不能给各开发组长开放所有的配置权限；
- 5、配置变更流程不合理，不能由各小组长审批。
- 6、配置控制存在问题，不能直接从产品库剪切至开发库，修改完成后也不能直接放回产品库或受控库。
- 7、版本管理存在问题，没有保存配置项旧版本
- 8、未进行有效的配置项识别。
- 9、配置项功能与需求不一致。

【问题 2】（8 分）

结合案例，简要说明你对项目、项目集和项目组合的理解。并判断 A 公司启动一个全新的在线购物平台项目，同时还启动了与在线购物平台相关的物流管理平台、客户管理平台、人力资源管理平台等相关项目适合采用什么进行管理。

【参考答案】

项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。

项目集是一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动，以便获得分别管理所无法获得的效益。

项目组合是为实现战略目标而组合在一起管理的项目、项目集、子项目组合和运营工作的集合。

A 公司的这部分项目适合采用项目集进行管理。

【问题 3】（5 分）

结合案例，简述功能配置审计和物理配置审计验证的内容。

【参考答案】

功能配置审计是审计配置项的一致性（配置项的实际功效是否与其需求一致），具体验证主要包括：①配置项的开发已圆满完成；②配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征；③配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等。

物理配置审计是审计配置项的完整性（配置项的物理存在是否与预期一致），具体验证主要包括：①要交付的配置项是否存在；②配置项中是否包含了所有必需的项目等。

【问题 4】（4 分）

请判断以下描述是否正确（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，不正确的选项填写“×”）：

(1) 项目集生命周期包括项目集定义阶段、项目集交付阶段和项目集收尾阶段。其中项目集组件授权与规划属于项目集定义阶段。()

(2) 项目组合规划阶段的主要活动是验证业务和运营战略，识别项目组合组件，为项目组合及其组件定义长期路线图。()

(3) OPM 框架的关键要素包括：OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和人才管。

(4) 基线通常对应于项目过程中的里程碑，一个项目可以有多个基线，也可以只有一个基线。

【参考答案】

(1) ×、(2) ×、(3) √、(4) √

解析：(1) 项目集生命周期包括项目集定义阶段、项目集交付阶段和项目集收尾阶段。其中项目集组件授权与规划属于项目集交付阶段。(2) 项目启动阶段的主要活动是验证业务和运营战略，识别项目组合组件，为项目组合及其组件定义长期路线图。

2025 年上半年 信息系统项目管理师 论文试题二

请以“论信息系统项目的范围管理”为题论述：

1、概要叙述你参与管理过程的信息系统项目（项目背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。

2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目的范围管理的认识，并总结你的心得体会。

（1）项目范围管理的过程；

（2）结合你管理的项目，制定一份项目范围说明书

（3）请根据你所描述的项目，说明你是如何进行范围确认的。

3、请结合你所参与管理过的信息系统项目，论述你进行项目范围管理的具体做法，并总结心得体。
